



OT-01

TRANSFERA DERGUESE
Informata për Bankën dërguese

Banka për Biznes Prishtinë
DegaSKENDERAJ

Informata - klienti dërgues

Llogaria 1305-0030-117617.62
BERAT SYLANAJ

TRANSFERA DERGUESE
Informata për Bankën përfituese

TEB - Turk Ekonomi Bankasi

Informata - klienti përfitues

Llogaria 2013000126741692
NNP ATC COM SHPK

Detajet: BERAT SYLANAJ PAGESE E FATURES NR.0212-01/2024

Vlera: 12,594.55 EUR

twelvethousandfivehundredninetyfour and 55/100

Numri kontrollues 53000134982

Gjithsej provizion dhe tatim 5.00

02.12.2024

Data


3 575 1 16 02.12.2024 14:10

Nënskrimi digjital

Specifikacioni I parave te gatshme		
Banknota	Sasia	Vlera
500,00		
200,00		
100,00		
50,00		
20,00		
10,00		
5,00		
Monedhat		
2,00		
1,00		
0,50		
0,20		
0,10		
0,05		
0,02		
0,01		
Total:		



Sign.



N.N.P. "ATC COM" SH.P.K.

FATURE TATIMORE

Nr: 0212-01/2024

Shitësi:	N.N.P. "ATC COM" SH.P.K.	Blerësi	Berat Sylanaj
Owner:	ARBEN MURSELI		
NRU:	810198780		1175192197
Fiskal:	810198780		
Adress:	DOGANAJ, KAQANIK		Skenderaj
Account			
Nr.Bank	2013000126741692,		

Nr.	Përshkrimi	Nj.m.	Sasia	çmimi	TVSH 0%	Shuma Totale
1	Ndërrimi i dritareve të jashtme me material PVC	m ²	36.67	170.00	-	6,233.65
2	Ndërrimi i dyerve të jashtme me material PVC	m ²	6.77	350.00	-	2,370.90
3	Termoizolim i kulmit me leshguri t-15cm me peshe 40kg	m ²	114	35.00	-	3,990.00
4						
5						
						€ 12,594.55

Date: 02.12.2024


Payment Përmes bankës
Bank: 1.TEB 2013000126741692,

Faturimi në bazë të nen-paragrafit 3.1, paragrafi 3 i nenit 33 të Ligjit nr.05/L-037 për tatimin mbi Vlerën e shtuar

Prangj:

Dorezoi:

1. Punet te cilat jane ekzekutuar ne Nderrimin e dritareve si dhe izolimin e kulmit me lesh guri

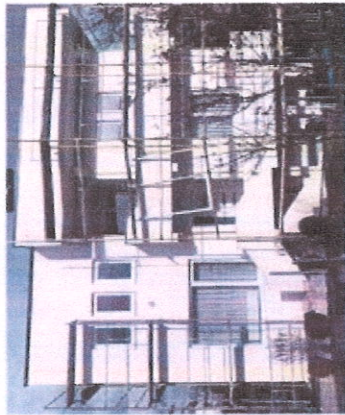Pershkrimi i masës		Sasia [m ²]	Cmimi per njësi [Euro]	Kostoja totale [Euro]
<p>Foto</p> <p>Dritaret</p> 	<p>Pershkrimi</p> <p>Nderrimi i dritareve te jashtme dhe dnyrve te terraces ekzistues me te rejat nga PVC me keto karakteristika: - Korniza e profilit me trashesi se paku b/h=80/80 mm dhe min. 6 fusha termike dhe tre goma/dihitunga - Xhami i dyfishtë 4+16+4 mm, i mbushur me argon dhe xham Low "E" nga ana e brendshme. - Mekanizmi mbyllës me kualitet të lartë sipas DIN, EN, ISO - Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë, U<sub>1.4</sub> W/m^{2<sup>K</sup>}</p> <p>Ketu perfshihet kostoja e blerjes (furnizimit), instalimi/montimi me te gjitha materialet e nevojshme harrxhese qe rezultojne ne produkt final funksional. Me nderrim dritareve te jashtme dhe dnyrve te terraces nenkuptohen edhe te gjitha punet tjera demoluese te dritareve ekzistuese, pastrimi i siperfaqeve per vendosjen e dritareve dhe dnyrve te terces te reja, vendosjen dhe perforcimin me ankerim dhe me bulona, vendosjen e shkumes, vendosjen e kendoreve dhe rregullimin e siperfaqeve te demtuara nga te dy anet si dhe vendosjen e pikoreve dhe sellbankave. Ngjyra e profilit te dritareve, vendosja eventuale e roletave jane zgjedhje e lire e pronarit.</p>	36.67	170.00	6,233.65




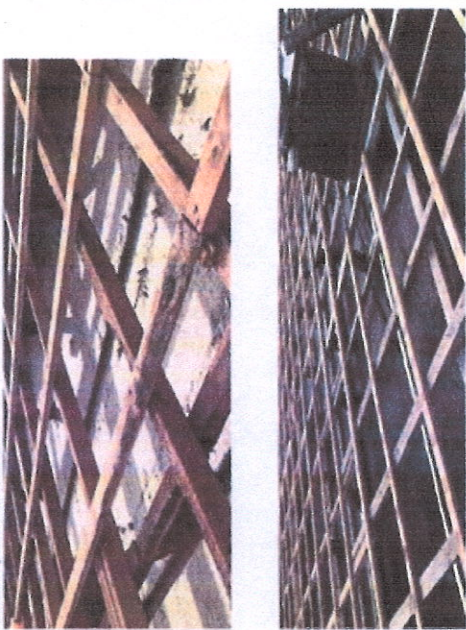
.....	<p>Dyert e jashtme</p> 	<p>Nderrimi i dyerve të hyrjes ekzistuese me të reja të PVC me këto karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korniza e profilit me trashësi së paku b/h=80/80 mm dhe min. 6 fusha termike dhe tre goma/dihitunga - Xhami i dyfishtë 4+16+4 mm, i mbushur me argon dhe xitami Low "E" nga ana e brendshme. - Mekanizmi mbyllës me kualitet të lartë sipas DIN, EN, ISO - Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë, U<sub>s14</sub> W/m<sup>2</sup>K - Rrip me furçë për mbrojtje nga moti - Cilindri i qelësit 	6.77	350.00	2.370.90
<p>Isolimi i pllakës nën kullimit</p> 	<p>Termoizolimi i pllakës nën kullim me lesh guri, me trashësi ≥15 cm, me dendësitë p>40 kg/m³, përçueshmëria termike λ<sub>50.04</sub> W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit Euroclass A1 sipas EN13501; Këtu përfshihet kostoja e bierjes (furnizimit), instalimi/montimi me të gjitha materialet e nevojshme hartuese që rezultojnë në produkt final funksional. Me termoizolim të pllakës nën kullim përpos shtresës së materialit termoizolues (leshit guri) nëkuptohen edhe të gjitha shtresat tjera të nevojshme deri në finalizim, sic mund të jenë:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membranë e përshkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj ujit, vendosur mbi termoizolim 2. Lesh guri t=10+5cm, vendosur mes trajeve të drurit 3. Membranë e përshkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj ujit, vendosur mbi termoizolim <p>Barriera kundër avullit, vendosur nën termoizolim</p>	114.00	35.00	3.990.00	
Kostoja totale e masave të efijencës së energjisë				[Euro]:12.594.55	



FOTO GJATE EKZEKUTIMIT TE PUNIMEVE

